


1- PBS


PBS correspond à une expression des besoins, il permet la décomposition arborescente du projet en liste d'éléments des livrables dont la combinaison constitue la totalité de l'ouvrage projet. C'est-à-dire un procédé qui établit l'arborescence des différents composants du projet. Cette décomposition fournit une liste hiérarchisée du produit final et intermédiaire qui le composent.

Univers-Sol présente ce PBS ci-dessous au projet pharmafy dans le but d'atteindre les objectifs demandés.

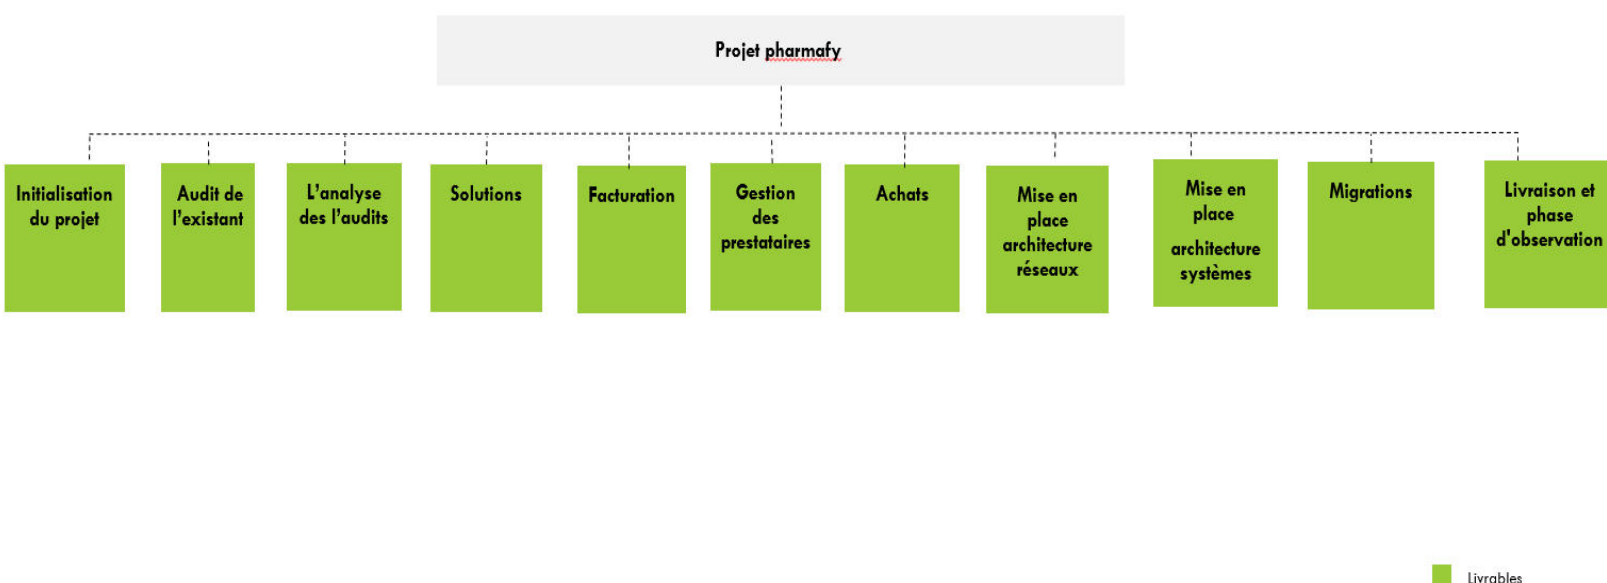

2 - WBS (Work Breakdown Structure ou Organigramme des Tâches)


Le **Work Breakdown Structure** (WBS ou OT Organigramme des Tâches) est un arbre représentant la liste structurée de tous les travaux du projet. Il s'agit d'un organigramme composé de plusieurs niveaux qui hiérarchise des tâches et des sous-tâches découlant des sous livrables et ou des livrables. Ci-dessous le WBS présenté par Univers-Sol dans le cadre du projet pharmafy.

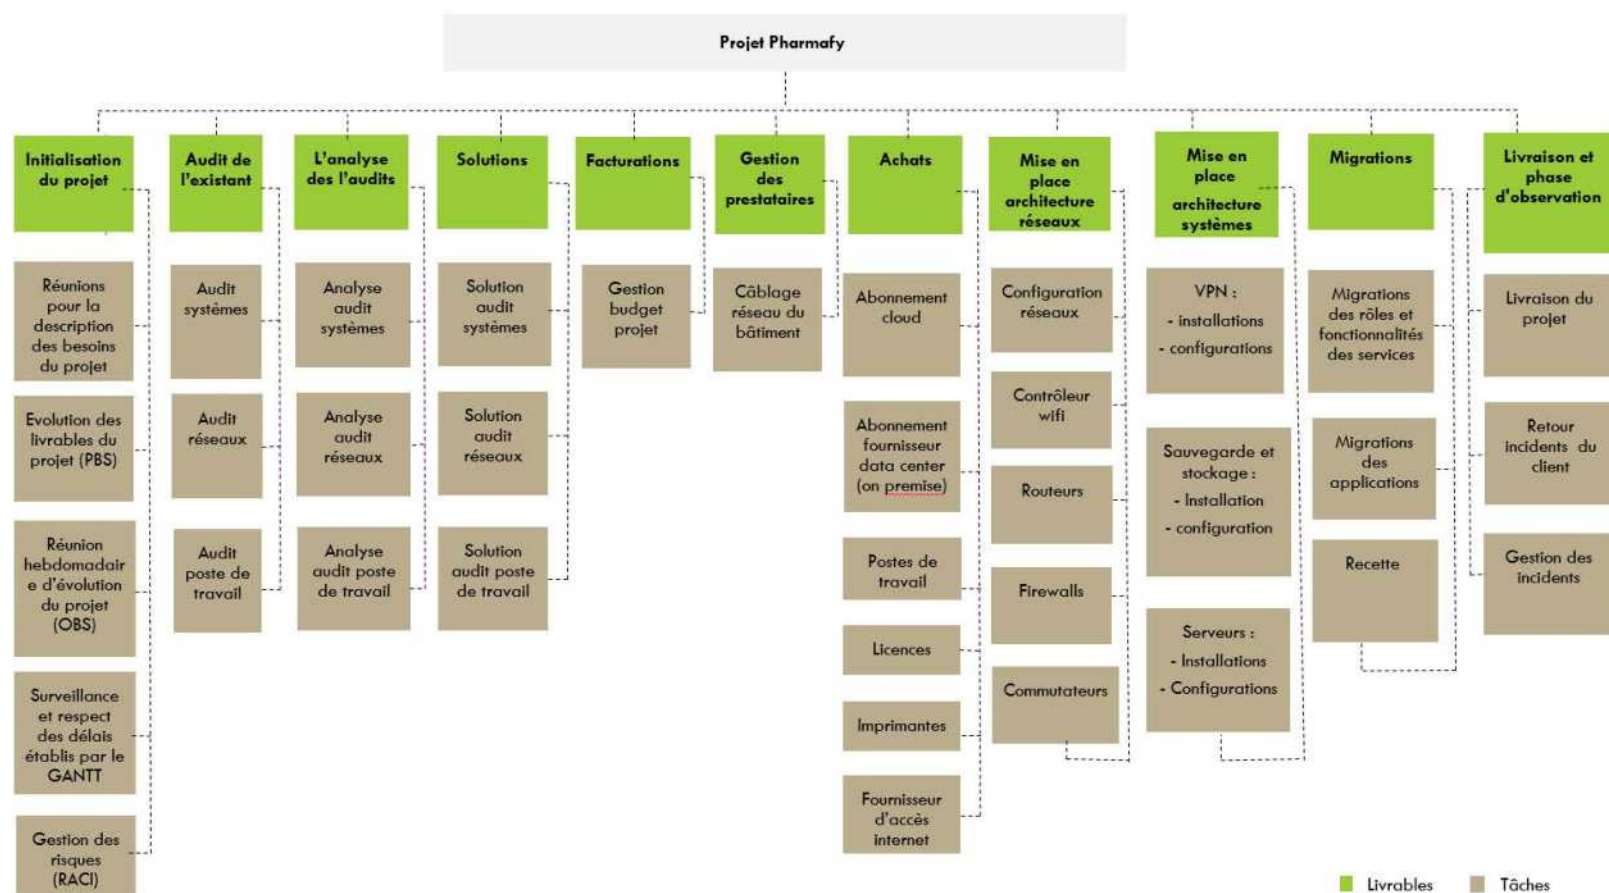

3 - OBS (Organisation Breakdown Structure ou Structure organisationnelle du projet)

Le OBS (Organisation Breakdown Structure ou Structure organisationnelle du projet) est une décomposition hiérarchique des responsabilités du projet, pour individualiser la personne ou le bureau responsable de chaque lot de travail et ainsi répondre à la question quels sont : les Acteurs, les Compétences, les Relations et Interdépendances des divers pôles de responsabilités dans le cadre de ce projet.

Dans le cadre de ce projet, nous allons faire intervenir des acteurs de la société Pharmaphy et de Univers-Sol pour l'exécution des diverses tâches déclarées précédemment dans le WBS.

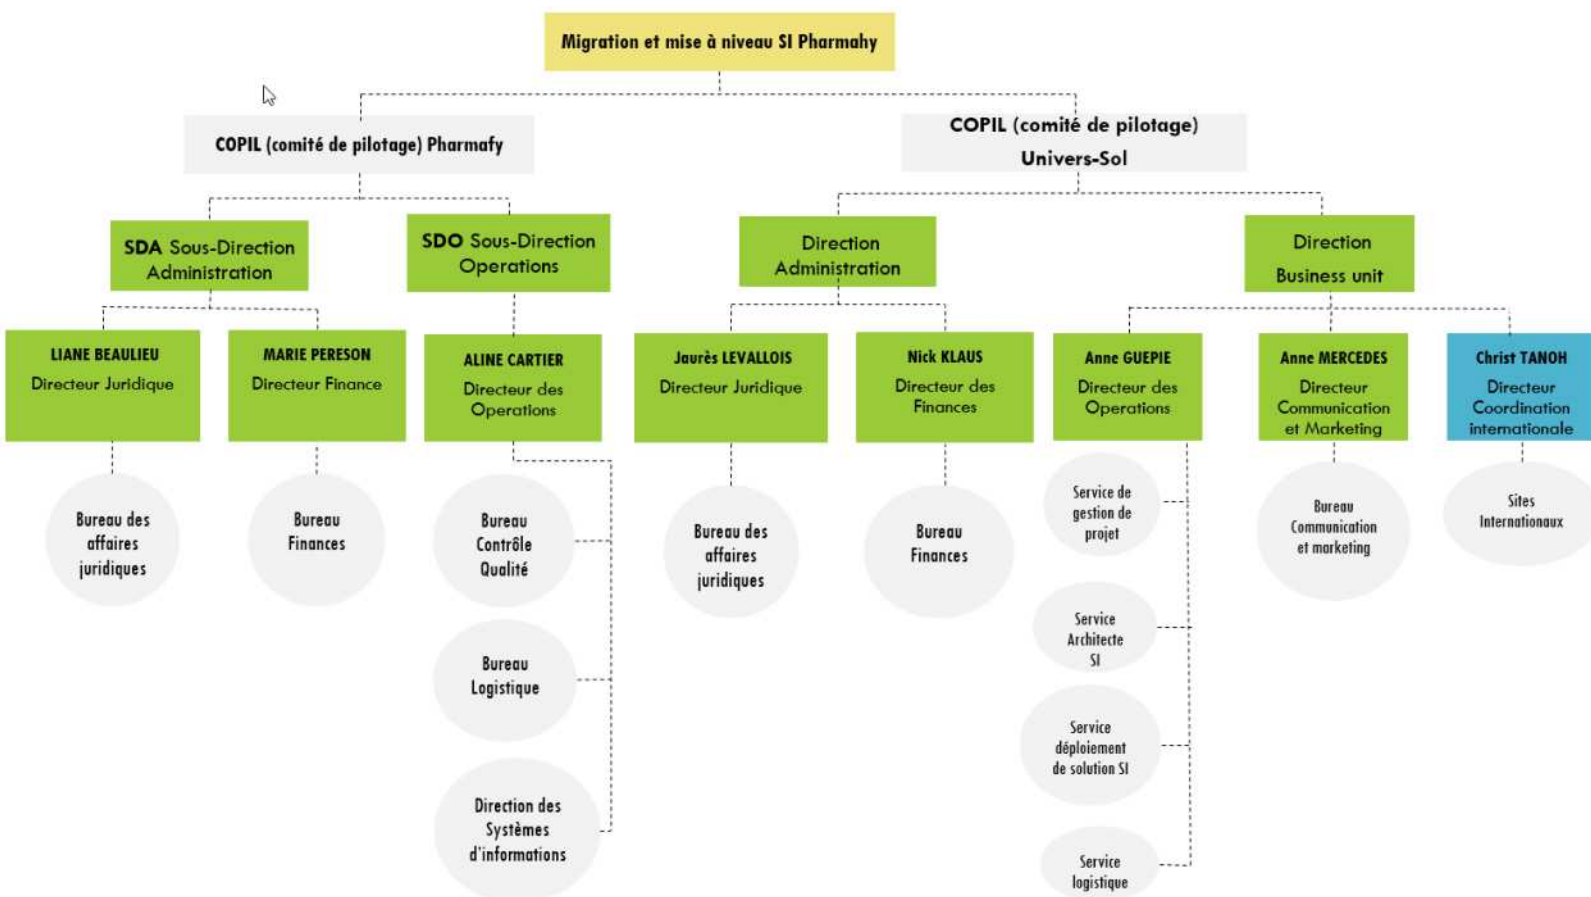

4 - RACI (Responsible Accountable Consulted Informed)

RACI est un outil de gestion, sous forme d'une matrice, utilisé pour l'affectation des rôles et responsabilités au sein d'une équipe.

Elle peut être appliquée dans le cadre d'un projet, ou d'une manière plus générale dans un département ou d'une organisation afin d'avoir une vision claire de la répartition des tâches.

Nous allons combiner l'**OBS** et le **WBS** sous la forme d'un tableau à doubles entrées appelé la **RAM**, **Responsibility Assignment Matrix** avec comme objectif d'assigner les différentes ressources (membres d'équipes) disponibles aux diverses tâches à exécuter.

RACI Matrix

Migration et mise à niveau SI Pharmathy																	
		ROLES	COPIL	Chef de projet	Resp pôle infra(systèmes et réseaux)	Ingenieur systèmes	Ingenieur réseaux et sécurité	Administrateur systèmes et réseaux	Administrateur stockage et sauvegarde	Administrateur de base de données	Service applicatif	Technicien informatique	service hardware et software	Fournisseur	Prestataire	COPIL	Direction des Systèmes d'Informations
Livrables et tâches		Status	Univers-Sol														Pharmaphy
Initialisation du projet																	
Réunions descriptive des besoins et objectif			C	R	A	A	A	A	A	A	A	C	C	N/A	N/A	C	A
Cadrage de projet (PBS,WBS,OBS,RACI,GANTT et gestion des risques)			I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	N/A	N/A	N/A	N/A
Rapport cadrage			A	R	A	I	I	I	I	I	I	I	I	N/A	N/A	A	A
Audit de l'existant																	
Audit systèmes			I	I	I	R	C	R	R	R	C	I	C	N/A	N/A	C	C
Audit réseaux			I	I	I	C	R	R	C	C	C	I	C	N/A	N/A	C	C
Audit poste de travail			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	N/A	N/A	C	C
L'analyse des audits																	
Analyse audit systèmes			I	I	I	R	I	R	R	R	I	I	I	N/A	N/A	I	I
Analyse audit réseaux			I	I	I	I	R	R	I	I	I	I	I	N/A	N/A	I	I
Analyse audit poste de travail			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	N/A	N/A	I	I
Elaboration des solutions																	
Solutions systèmes			A	I	C	R	I	R	R	R	I	I	I	N/A	N/A	A	A
Solutions réseaux			A	I	C	I	R	R	I	I	I	I	I	N/A	N/A	A	A
Solutions poste de travail			A	I	C	I	I	I	I	I	I	I	R	N/A	N/A	A	A
Gestion des Prestataires																	
Câblage réseau du bâtiment			I	I	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R	I	I
Achats																	
Devis			A	I	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I	R	R	N/A	N/A
Achat des équipements réseaux			A	I	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R	R	N/A	N/A	N/A
Achat des serveurs physique			A	I	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R	R	N/A	N/A	N/A
Achat des postes de travail et des consommables informatiques			A	I	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R	R	N/A	N/A	N/A
Abonnement fournisseur data center (on premise)			A	I	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R	R	N/A	N/A	N/A
Abonnement Cloud			A	I	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R	R	N/A	N/A	N/A
Licences			A	I	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R	R	N/A	N/A	N/A
Fournisseur d'accès internet			A	I	C	N/A	C	C	I	N/A	N/A	N/A	N/A	R	N/A	I	I
Mise en place de l'architecture réseaux																	
configuration réseaux			I	I	I	I	R	R	C	C	C	R	I	N/A	N/A	I	I
Commutateurs			I	I	I	I	R	R	I	I	I	R	C	N/A	N/A	I	I
Routeurs			I	I	I	I	R	R	I	I	I	R	C	N/A	N/A	I	I
Firewalls			I	I	I	I	R	R	I	I	I	R	C	N/A	N/A	I	I
Contrôleur wifi			I	I	I	I	R	R	I	I	I	R	C	N/A	N/A	I	I
Mise en place de l'architecture système																	
VPN (installation et configuration)			I	I	I	R	I	R	I	I	I	I	N/A	N/A	N/A	I	I
Serveurs (installation et configuration)			I	I	I	R	I	R	I	I	I	I	C	N/A	N/A	I	I
Sauvergarde et stockage			I	I	I	R	I	C	R	I	R	R	C	N/A	N/A	I	I
Migrations																	
Migrations des rôles et fonctionnalités des services			A	I	C	R	R	R	C	C	C	I	N/A	N/A	N/A	C	C
Migrations des applications			A	I	C	R	C	R	C	R	R	I	N/A	N/A	N/A	C	C
Tests			I	I	C	R	R	R	R	R	R	R	I	N/A	N/A	C	C
Livraison et phase d'observation																	
Livraison du projet			A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	I	N/A	N/A	A	R
Retour des possibles incidents du client			I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	N/A	N/A	R	R
Gestion des incidents			I	I	R	R	R	R	R	R	R	R	C	N/A	N/A	I	C

N/A Non applicable

R Réalisateur

A Approuvateur

C Consulté

I Informé

5 – Gantt

Le diagramme de Gantt est un graphique à barres horizontales qui résultent des valeurs en abscisse représentant le temps (avec des unités mois, semaines ou jours) et en ordonnée la liste des tâches, qui permet de visualiser et de gérer les travaux à réaliser. Utile pour la coordination et la planification, le diagramme de Gantt montre aussi l'avancement du projet.

