



2.6.2 ISO 9001


La norme « ISO 9001 » est la norme internationale pour les Systèmes de Management de la Qualité (QMS), publiée par ISO (l'Organisation Internationale de Normalisation).

La norme « ISO 9001 » étant un référentiel de management orienté Qualité, voici les principaux éléments :

- L'orientation client
- L'engagement de la hiérarchie
- L'implication du personnel
- L'approche processus
- L'amélioration continue
- L'approche factuelle pour la prise de décision
- Les relations mutuellement bénéficiaires avec les fournisseurs.

2.7 Les produits attendus du projet (PBS)

PBS qui se définit par Product Breakdown Structure, ou Organigramme Technique de Produit, ou Livrable est la décomposition hiérarchique des produits à réaliser lors d'un projet.




2.8 Organigramme des tâches du projet (WBS)

WBS (Work Breakdown Structure), ou Organigramme des tâches, est une décomposition hiérarchique des travaux nécessaires pour réaliser les objectifs d'un projet.

Le WBS ou démarche de découpage en activité est constituée d'éléments, chaque élément correspondant à une tâche ou à un ensemble de tâches.

L'élément premier de WBS est le nom du projet, dans notre cas c'est « Migration Groupement Mutualiste », à partir de celui-ci les autres éléments sont créés pour décrire chaque tâche du projet.


Le WBS a pour but d'aider à organiser le projet, à éditer la planification de référence et le budget prévisionnel.

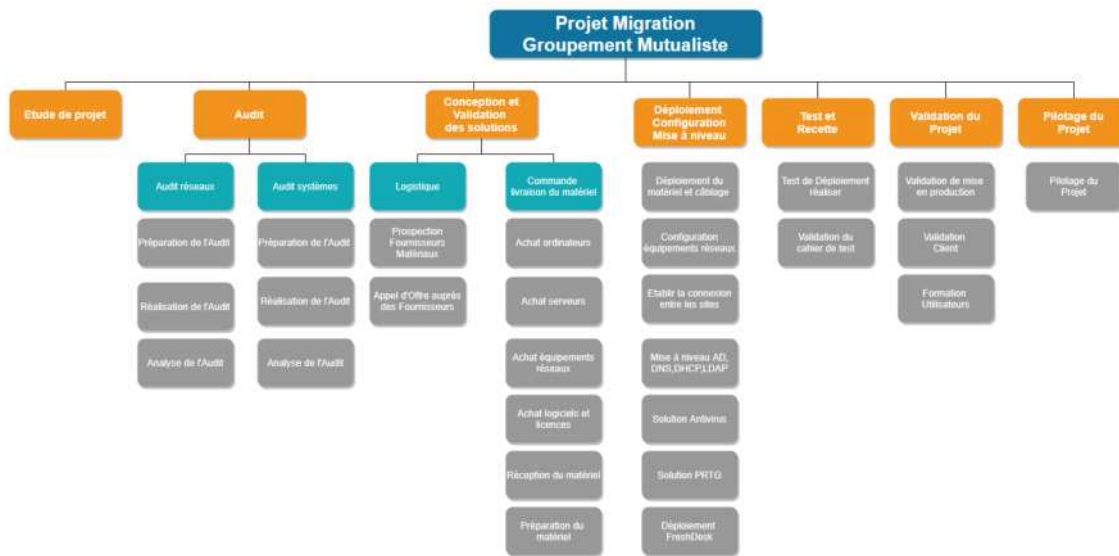

2.9 L'organisation du projet (L'OBS)

L'OBS ou encore appelé Organizational Breakdown Structure, est un schéma qui représente les responsabilités de chaque membre pour chaque tâche du projet que ça soit du côté client ou du côté de l'entreprise qui va réaliser le projet.

L'OBS répond aux questions suivantes : Qui fait quoi, quelles sont les compétences attendues, les responsabilités déléguées, la disponibilité des acteurs, leurs relations et leurs interdépendances.

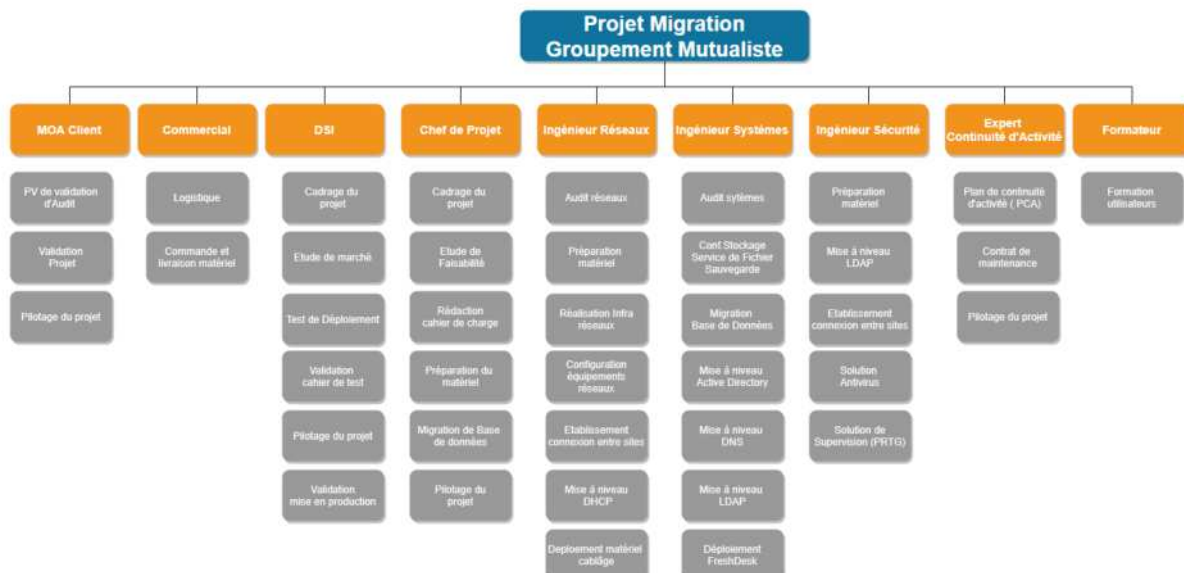



2.10 Les responsabilités du projet (Matrice RACI)

L'acronyme RACI (Responsible, Accountable, Consulted et Informed) présente une matrice des responsabilités, elle indique les rôles et les responsabilités des intervenants au cours de chaque processus et activité.

MATRICE RACI 'Projet Groupement Mutualiste' Rôles et Responsabilités			Réalisateur, Approuvateur, Consulté, Informé									
			ROLES	Directeur SI	Chef de Projet	Ingénieur Réseaux	Ingénieur Systèmes	Ingénieur Sécurité	Expert PCA/PRA	MOA Client	Commercial	Formateur
Livrable ou Tâche	Statut											
ID	Etude de Projet											
T001	Cadrage du projet	Terminé	A	R	C	C	C	C	I	I	x	x
T002	Etude de faisabilité	Terminé	A	R	C	C	C	C	I	I	x	x
T003	Etude de marché	Terminé	A	R	I	I	I	I	I	I	x	x
T004	Rédaction du cahier de charge	Terminé	A	R	C	C	C	C	I	I	x	x
Audit												
T005	Préparation de l'Audit	Terminé	I	A	R	R	C	I	I	I	x	x
T006	Réalisation de l'Audit	Terminé	I	A	R	R	C	I	I	I	x	x
T007	Analyse de l'Audit	Terminé	I	A	R	R	C	I	I	I	x	x
Conception												
T008	Etude Technique	Terminé	A	R	R	R	R	C	I	I	x	x
T009	Validation de la nouvelle architecture	Terminé	A	I	R	R	R	I	I	I	x	x
Logistique												
T010	Prospection fournisseur matériel	Terminé	A	I	C	C	C	I	I	I	R	x
T011	Appel d'Offre auprès des fournisseurs	Terminé	A	I	C	C	C	I	I	I	R	x
T012	Commande et Livraison du matériel	Terminé	A	I	C	C	C	I	I	I	R	x
Déploiement												
T013	Mise en place du matériel et câblage	Terminé	A	C	R	C	R	I	I	I	x	x
T014	Configuration des équipements réseaux	Terminé	A	C	R	I	R	I	I	I	x	x
T015	Etablir une connexion entre les sites	Terminé	A	C	R	C	R	I	I	I	x	x
T016	Mise à niveau Active Directory	Terminé	A	C	C	R	C	I	I	I	x	x
T017	Mise à niveau DNS, DHCP, LDAP	Terminé	A	C	R	R	C	I	I	I	x	x
T018	Mise en place Firewall	Terminé	A	I	R	C	R	I	I	I	x	x
T019	Mise en place VPN	Terminé	A	I	R	C	R	I	I	I	x	x
T020	Solution Antivirus	Terminé	A	I	C	C	R	I	I	I	x	x
T021	Configurer le Stockage et Sauvergarde	Terminé	A	I	I	R	C	I	I	I	x	x
T022	Migration de bases de données	Terminé	A	R	C	R	C	I	I	I	x	x
T023	Solution de Supervision (PRTG)	Terminé	A	C	C	C	R	I	I	I	x	x
T024	Déploiement Fresh Desk	Terminé	A	I	I	R	I	I	I	I	x	x
T025	Assurer un PCA / PRA	Terminé	A	I	C	C	C	R	I	I	x	x
T026	Fournir un contrat de maintenance	Terminé	I	I	C	C	C	A	I	I	x	x
Test et Recette												
T027	Test de Déploiement Réaliser	Terminé	I	R	R	R	R	C	I	I	x	x
T028	Validation de cahier de Test	Terminé	A	R	C	C	C	C	I	I	x	x
Validation Projet												
T029	Validation de mise en production	Terminé	R	C	C	C	C	C	I	I	x	x
T030	Validation Client	Terminé	I	I	I	I	I	I	A	I	x	x
T031	Formation utilisateurs	Terminé	A	I	I	I	I	I	I	I	x	R
Pilotage du Projet												
T032	Suivi du Projet	Terminé	A	R	I	I	I	R	I	I	x	x
R	Réalisateur	Réalise la tâche et est responsable de son achèvement										Statut
A	Approuvateur	Approuve l'achèvement d'une tâche. Seulement 1 par tâche										Pas débuté
C	Consultant	Conseille, intervient avant une décision ou une action										En cours
I	Informé	Doit être informé après une décision ou une action										Terminé



2.11 LA GESTION DES RISQUES

2.11.1 Probabilité des risques

Identifier l'impact des risques. Mais avant cela, nous devons évaluer la probabilité qu'un risque se produise. Pour ce faire, nous devons savoir dans quelle mesure le risque est détectable à partir de la liste des risques connues.

Le but de cette évaluation est de déterminer la gravité du risque. La criticité est le produit de la probabilité d'occurrence et de l'impact du risque. Ces impacts peuvent être associés à des coûts, des retards et/ou des ressources. A partir de ces éléments, nous pouvons construire une matrice clé et vous permettre de déterminer la gravité de votre risque, qu'il soit acceptable ou non, afin de mieux maîtriser votre risque.

Quel sont les types de risque ?

Les types de risque permettent de catégoriser les risques pour mieux guider l'analyse.

Les principaux risques que nous avons pu identifier sont :

- Soumissions tardives.
- Problèmes matériels lors de la réception.
- La non-réception du matériel commandé faute de stock épuisé ou grève et ou d'épidémie.

Les différents risques seront analysés dans le tableau ci-dessous, et seront réévalués suite aux différentes solutions proposées, afin de redescendre sous le seuil de criticité.

2.11.2 Matrice des risques

Probabilités / Impact	Très faible (1)	Faible (2)	Important (3)	Catastrophique (4)
Improbable (1)				- Manque de compétence d'un collaborateur - Piratage informatique
Peu probable (2)		- Fuite d'informations - Résistance des collaborateurs	- Demande de changement - Mauvaise ambiance	- Retard sur le planning - Manque de ressources
Probable (3)		- Problème/Retard de livraison	- Absence d'un collaborateur - Panne de matériel - Retard sur la mise en place du matériel - Mauvaise compréhension du besoin	- Problème de connexion - Délai insuffisant - Perte de motivation - Manque d'informations - Travail solitaire - Pertes de données
Très probable (4)				- Problème électrique - Problème de connexion - Difficulté d'accès au site



Migration Groupement Mutualiste							S'installe chez vous				
1											
2	Id du risque	Identification	Impact	Probabilité	détection	risque	Stratégies de gestion (Actions mise en place)	Impact	Probabilité	détection	risque
3	1	Le respect du planning : délai trop court	4	3	3	36	Etablir une planification des tâches et fixer des dates butoirs réalistes en gardant une marge de manœuvre. -Diviser le projet en étapes et définissez une date limite pour chacune des tâches. -Prévoyez des alertes pour chaque échéance.	4	2	3	24
4		Financier : coût supérieur à l'estimation	4	3	3	36	Étude du marché.	4	2	3	24
5		Humains : conflits, mauvaise affectation des responsabilités	4	4	2	32	Aborder tous les problèmes, et intervenir rapidement en cas des conflits en collaborant afin de trouver un consensus. Conserver une structure organisationnelle claire, et respecter les schémas établis. Les collaborateurs doivent vérifier en permanent l'affectation des responsabilités.	2	2	3	12
6		Humains : Désengagement, désintéressement de chaque responsable de lots sur le projet.	3	4	3	36	Valoriser le travail du collaborateur, lui faire comprendre son importance et établir une prime d'objectif. -Prévoir un remplacement de chaque ressource avec un niveau de compétence équivalent.	2	2	1	4
7		Logistique : Retard de livraison commande défectueuse ou non conforme	4	2	4	32	-Prévoir une marge pour les livraisons -Etablir des délais de remplacement très rapide en livraison premium. -Avoir du matériel en plus.	3	2	2	12
8		Technique : Les spécifications du client sont floues	4	3	3	36	-Définissez des échéances claires avec le client. -Etablir un Cadrage du projet et suivre le cahier des charges.	3	2	2	12
9		Technique : Les spécifications du client sont floues	3	3	4	36	-Etablir des formations pour accéder à des nouvelles connaissances si nécessaire -Faire appel à des sous-traitants dans les tâches complexes	3	2	2	12
10		Sécurité : Fuite des données confidentielles de l'entreprise	4	2	3	8	Respecter les procédures de sécurité pour la sauvegarde des données. Limité l'accès sur le traitement des données au travailleurs interne.	4	2	1	8
11		Les risques associés aux parties prenantes externes : Fournisseurs à risque	4	4	2	32	Prospecter différents fournisseurs Etablir des contrats avec des fournisseurs réputés dans le marché. Déposer de plusieurs fournisseurs afin d'avoir plusieurs devis.	3	2	1	6
12	Juridique : Non-respect du contrat, et de la réglementations	4	3	3	36	Le respect des contrats établis. Etablir une étude des lois et des nouvelles réglementations	3	2	2	12	
13	Environnementaux : tempête, inondations, incendie	4	1	2	8	Renforcer les mesures de prévention. Entreposer le matériel dans des endroits sûrs.	4	1	2	8	
14	Résultat : Le client n'est pas satisfaisant par Le résultat	5	3	3	15	Faire un audit cibler des délais de l'infrastructure actuelle et proposer des améliorations et des solutions techniques qui réponds au besoin du client. H144 Informer le client sur l'avancement et établir des	4	1	2	8	




2.12 DIAGRAMME DE GANTT

Le diagramme de GANTT permet de planifier le projet et de rendre plus simple le suivi de son avancement. Ce projet de migration du groupement mutualiste a été d'une grande envergure, vous constaterez dans le tableau ci-dessous qu'il a été effectué en 98 jours, entre le 08/07/2022 au 22/11/2022.

PROJET-SFKD-IT - C:\Users\univite\Desktop\Gestion de Projets\News\PROJET-SFKD-IT.pod						
ProjectLibre						
Fichier Tâche Ressource Vue						
Enregistrer Nouveau Enregistrer sous Imprimer Prévisualiser PDF Information Calendrier Fenêtre des projets Mettre à jour Sauver la planification Effacer la planification						
Fichier Impression Projet						
	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources
1	Project Migration Groupement Mutualiste	98 jours	08/07/22 08:00	22/11/22 17:00		
2	Etude de projet	16 jours	08/07/22 08:00	29/07/22 17:00		
3	Cadrage du projet	3 jours	08/07/22 08:00	12/07/22 17:00		Ibrahima SAMAKE;Akseil ROUY
4	Etude de faisabilité	5 jours	13/07/22 08:00	19/07/22 17:00	3	Ibrahima SAMAKE
5	Etude de marché	5 jours	20/07/22 08:00	26/07/22 17:00	4	Akseil ROUY;Ibrahima SAMAKE
6	Redaction du cahier de charge	3 jours	27/07/22 08:00	29/07/22 17:00	4;5	Ibrahima SAMAKE
7	Audit	6 jours	01/08/22 08:00	08/08/22 17:00	2	
8	Audit Réseau	4 jours	01/08/22 08:00	04/08/22 17:00		
9	Préparation de l'Audit	1 jour	01/08/22 08:00	01/08/22 17:00	6	Woury DIALLO
10	Réalisation de l'Audit	2 jours	02/08/22 08:00	03/08/22 17:00	9	Woury DIALLO
11	Analyse de l'Audit	1 jour	04/08/22 08:00	04/08/22 17:00	10	Woury DIALLO
12	Audit Système	5 jours	02/08/22 08:00	08/08/22 17:00		
13	Préparation de l'Audit	1 jour	02/08/22 08:00	02/08/22 17:00	9	Badir FALL
14	Réalisation de l'Audit	2 jours	04/08/22 08:00	05/08/22 17:00	10	Badir FALL
15	Analyse de l'Audit	1 jour	05/08/22 08:00	05/08/22 17:00	11	Badir FALL
16	PV de Validation d'Audit Global	1 jour	08/08/22 08:00	08/08/22 17:00	15	MOA Client
17	Conception et validation des solutions	7 jours	09/08/22 08:00	17/08/22 17:00	7	
18	Etude Technique	6 jours	09/08/22 08:00	16/08/22 17:00	16	Ibrahima SAMAKE;Woury DIALLO;Badir FALL;Bo...
19	Validation de la nouvelle architecture	1 jour	17/08/22 08:00	17/08/22 17:00	18	Akseil ROUY;Ibrahima SAMAKE
20	Logistique	14 jours	18/08/22 08:00	06/09/22 17:00	17	
21	Prospection fournisseurs matériaux	5 jours	18/08/22 08:00	24/08/22 17:00	19	Mohamed AMARA
22	Appel d'offre auprès des fournisseurs	6 jours	25/08/22 08:00	01/09/22 17:00	21	Mohamed AMARA
23	Commande et livraison du matériel	3 jours	02/09/22 08:00	06/09/22 17:00	22	
24	Achat ordinateurs fixes et portables	1 jour	02/09/22 08:00	02/09/22 17:00	22	Mohamed AMARA
25	Achat Serveurs	1 jour	02/09/22 08:00	02/09/22 17:00	22	Mohamed AMARA
26	Achat des équipements réseaux	2 jours	02/09/22 08:00	05/09/22 17:00	22	Mohamed AMARA
27	Achat logiciels et licences	1 jour	02/09/22 08:00	02/09/22 17:00	22	Mohamed AMARA
28	Réception du matériel	2 jours	02/09/22 08:00	05/09/22 17:00	22	Mohamed AMARA
29	Préparation du matériel	3 jours	02/09/22 08:00	06/09/22 17:00	22	Ibrahima SAMAKE;Woury DIALLO;Badir FALL;Bo...
30	Déploiement, Configuration et mise à niveau	43 jours	07/09/22 08:00	04/11/22 17:00	20	
31	Mise en place du matériel et câblage	8 jours	07/09/22 08:00	16/09/22 17:00	29	Woury DIALLO;Boubacar KANTE
32	Configuration des équipements réseaux	3 jours	19/09/22 08:00	21/09/22 17:00	31	Woury DIALLO;Boubacar KANTE
33	Etablir une connexion entre les sites	2 jours	22/09/22 08:00	23/09/22 17:00	32	Woury DIALLO;Boubacar KANTE
34	Mise à niveau Active Directory	2 jours	26/09/22 08:00	27/09/22 17:00	31;32;33	Badir FALL
35	Mise à niveau DNS, DHCP, LDAP	2 jours	26/09/22 08:00	27/09/22 17:00	31;32;33	Badir FALL;Woury DIALLO
36	Mise en place Firewall	2 jours	26/09/22 08:00	27/09/22 17:00	31;32;33	Woury DIALLO;Boubacar KANTE
37	Mise en place VPN	1 jour	26/09/22 08:00	26/09/22 17:00	31;32;33	Woury DIALLO;Boubacar KANTE
38	Solution Antivirus	2 jours	28/09/22 08:00	29/09/22 17:00	31;32;33;34;35;36	Boubacar KANTE
39	Configurer le Stockage, Service de Fichier et Sauvegarde	10 jours	30/09/22 08:00	13/10/22 17:00	38	Badir FALL
40	Migration de bases de données	3 jours	14/10/22 08:00	18/10/22 17:00	39	Ibrahima SAMAKE;Badir FALL
41	Solution de Supervision (PRTG)	4 jours	19/10/22 08:00	24/10/22 17:00	40	Boubacar KANTE
42	Déploiement Fresh Desk	5 jours	25/10/22 08:00	31/10/22 17:00	41	Badir FALL
43	Assurer un Plan de Continuité et Réprise d'Activité	42 jours	07/09/22 08:00	03/11/22 17:00	29	Valentin MONTEIRO
44	Fournir un contrat de maintenance	1 jour	04/11/22 08:00	04/11/22 17:00	43	Valentin MONTEIRO
45	Test et Recette	2,667 jours	07/11/22 08:00	09/11/22 14:20	30	
46	Test de déploiement réaliser	2,667 jours	07/11/22 08:00	09/11/22 14:20	40	Woury DIALLO;Badir FALL;Boubacar KANTE
47	Validation du cahier de test	2 jours	07/11/22 08:00	08/11/22 17:00	40	Akseil ROUY
48	Validation Projet	7 jours	09/11/22 14:20	18/11/22 14:20	45	
49	Validation de mise en production	1 jour	09/11/22 14:20	10/11/22 14:20	46;47	Akseil ROUY
50	Validation Client	1 jour	10/11/22 14:20	11/11/22 14:20	49	MOA Client
51	Formation Utilisateurs	5 jours	11/11/22 14:20	18/11/22 14:20	49;50	Julien BLANC
52	Pilotage du Projet	82 jours	01/08/22 08:00	22/11/22 17:00	2	
53	Pilotage du Projet	82 jours	01/08/22 08:00	22/11/22 17:00		Valentin MONTEIRO;Ibrahima SAMAKE;MOA Client...

Ce diagramme de Gantt va nous permettre de présenter visuellement l'état d'avancement des différentes activités qui constituent notre projet :

- Les différentes tâches à envisager.
- La date de début et la date de fin de chaque tâche.
- La durée escomptée de chaque tâche.
- Le chevauchement éventuel des tâches.
- La date de début et la date de fin du projet dans son ensemble.

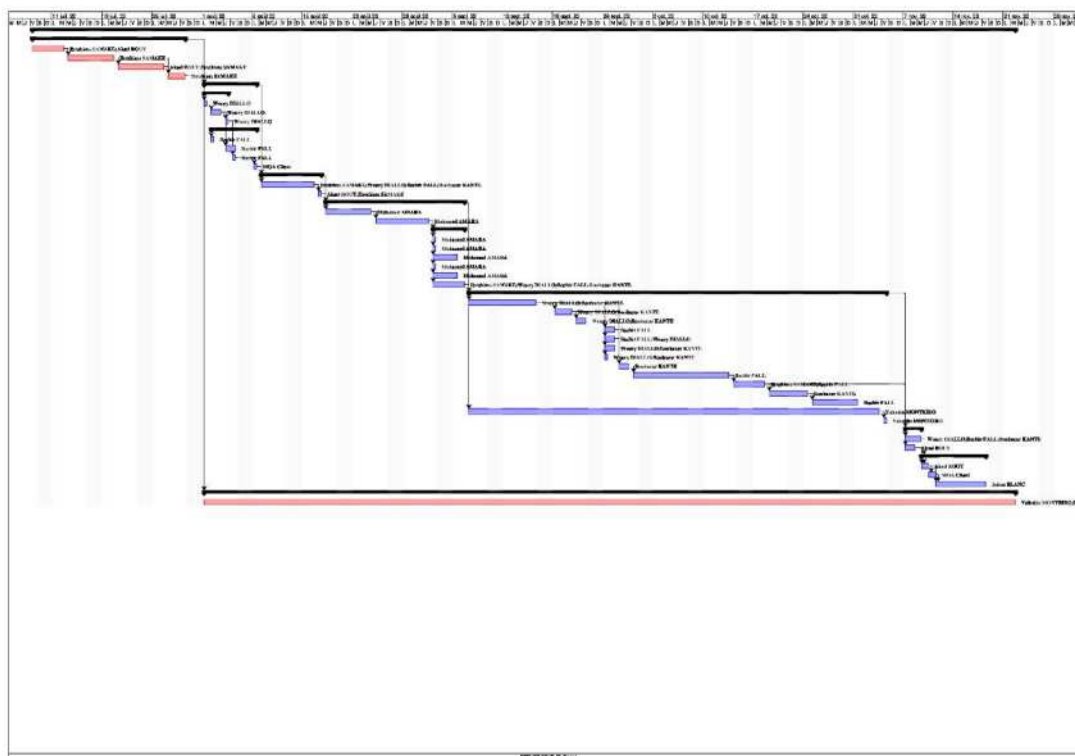

2.13 RGPD

Le sigle RGPD « **Règlement Général sur la Protection des Données** » encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne.

Il s'agit avant tout d'une analyse de l'usage que faite le Groupement mutualiste des données personnelles des clients et de leurs collaborateurs.

Avec la RGPD, le Groupement mutualiste serait en mesure de cartographier leurs données et de s'assurer de la licéité de l'usage des données.

La RGPD n'étant pas un sprint mais une course de fond, la RGPD est un process long et fastidieux. C'est pourquoi en accord avec le Groupement mutualiste, nous avons décidé de confier celle-ci à un prestataire externe **"It-systèmes"**.

It-systèmes étant elle-même conforme aux normes RGPD, nous avons en amont signé une clause de confidentialité concernant les données du Groupement mutualiste.

La RGPD est une histoire qui se construit pas à pas :

Désignez un pilote

Cartographiez les traitements de données personnelles

Priorisez les actions

Gérez les risques

Organisez les processus internes

Documentez la conformité
